# EUV 가속기 현안보고

홍주호 박사 (산업기술융합센터 EUV 운영팀)

2023.10.12(목)





# 개요

### ❖ PAL-EUV 광원

- 선형가속기
- 부스터링
- 저장링


# ❖ PAL-EUV 광원 시운전

- 전자빔 발생
- 부스터링 입사
- 부스터링 DC 운전
- 부스터링 램핑
- 부스터링 출사
- 해야 할 일



# PAL-EUV 광원

❖ 소형 가속기 기반 13.5nm EUV 광원

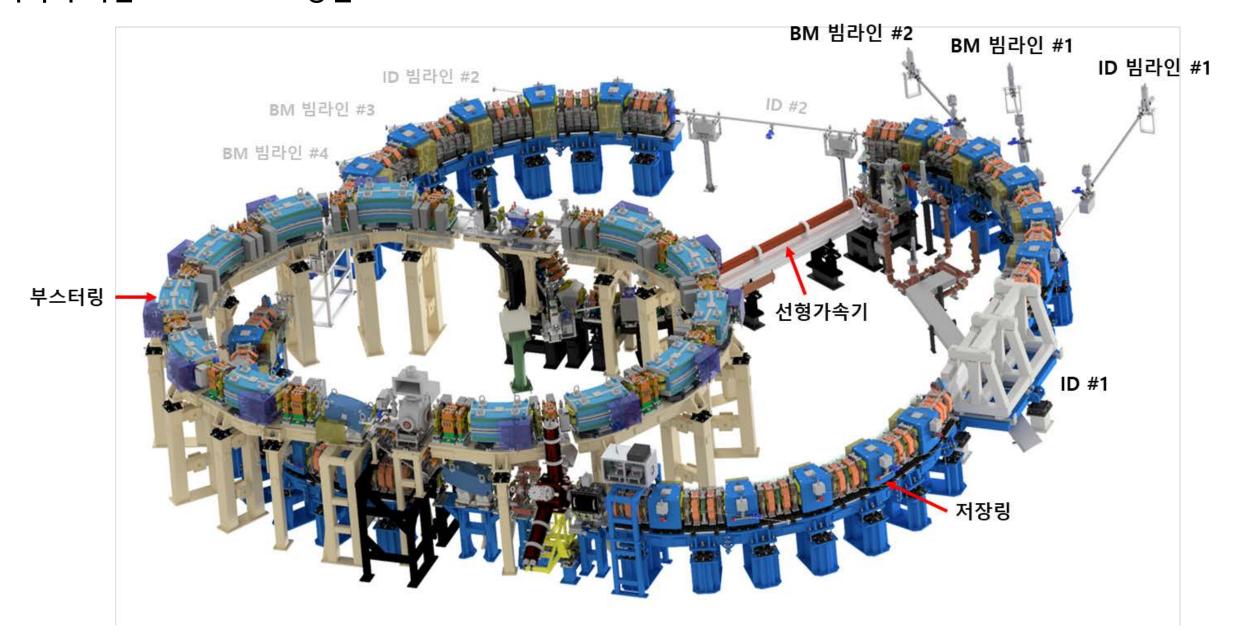

### 선형가속기 (Injector Linac)

### ❖ 선형가속기 종단 전자빔 사양

- 20 MeV에너지, 10~100 pC 전하량, 0.5 Hz 반복율

- 0.5 mm mrad Transverse normalized emittance


### ❖ 주요 구성품

- 광음극전자총 (2856 MHz 주파수, SW )

- 전자총레이저 (150 µJ 에너지, 257 nm 파장,

5 ps FWHM 펄스길이)


- 가속관 (2856 MHz 주파수, TW)

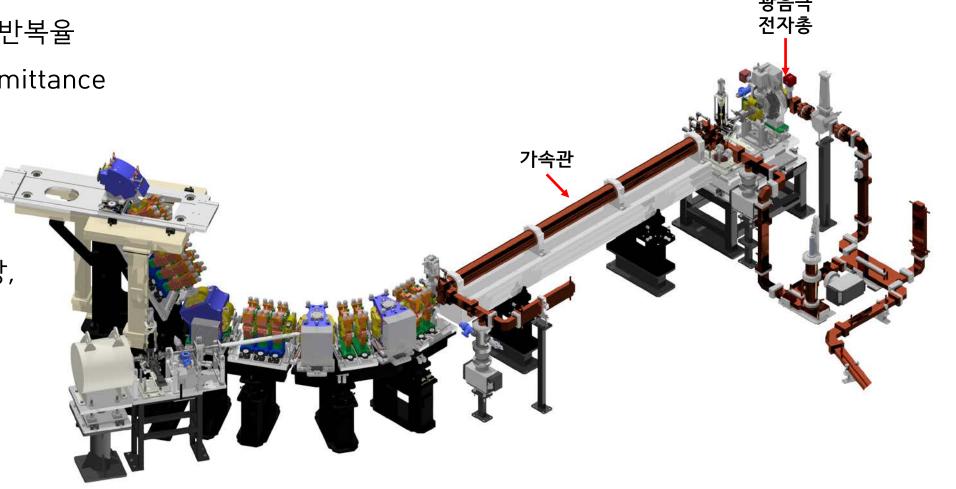



### 부스터링 (Booster Ring)

### ❖ 부스터링 사양

- 20 ~ 400 MeV 에너지 램핑
- 둘레 22.2 m (500 MHz, 37하모닉)
- 4.2 nm Horizontal emittance

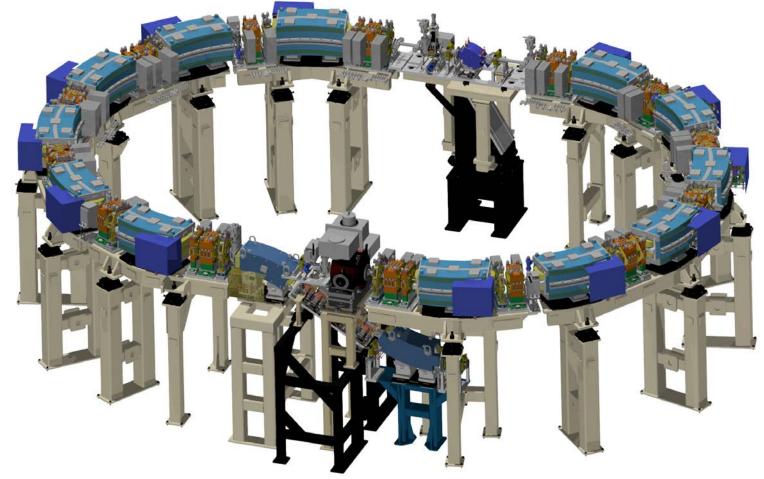

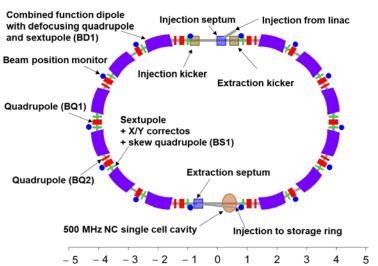






# 저장링 (Storage Ring)

# ❖ 저장링 사양

Parameters	Values @ 400 MeV					
Circumference	36 m					
Harmonic number	60					
Beam current	140 mA					
Emittance_X (nm)	1.16					
Tune_X	7.153					
Tune_Y	3.044					
Chromaticity X, natural	-10.66					
Chromaticity Y, natural	-16.71					
Chromaticity X, corrected	1.0					
Chromaticity Y, corrected	1.0					
Alpha	0.0104					
dE/turn (keV)	1.7					
Energy spread (E-4)	3.82					
Damping time X (ms)	30.7					
Damping time Y (ms)	56.7					
Damping time S (ms)	49.0					

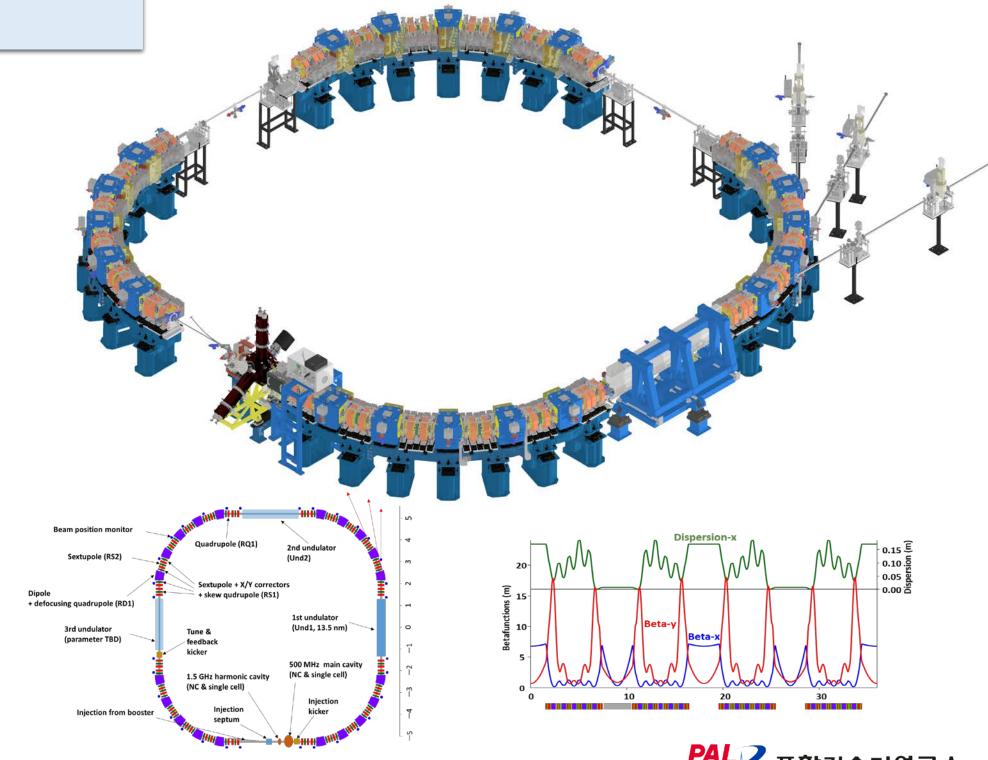




# PAL-EUV 광원 설치 (22. 5~11월)



# DCM 전자빔 발생 ❖ 23. 2월 초 전자빔 발생 SCM1 (전자총 종단) - 반복률: 0.5 Hz - 전하량: Max 100 pC - 에너지: Max 20 MeV SCM2 (빔덤프 앞)

# 부스터링 입사

❖ 23. 2월 초 부스터링 입사

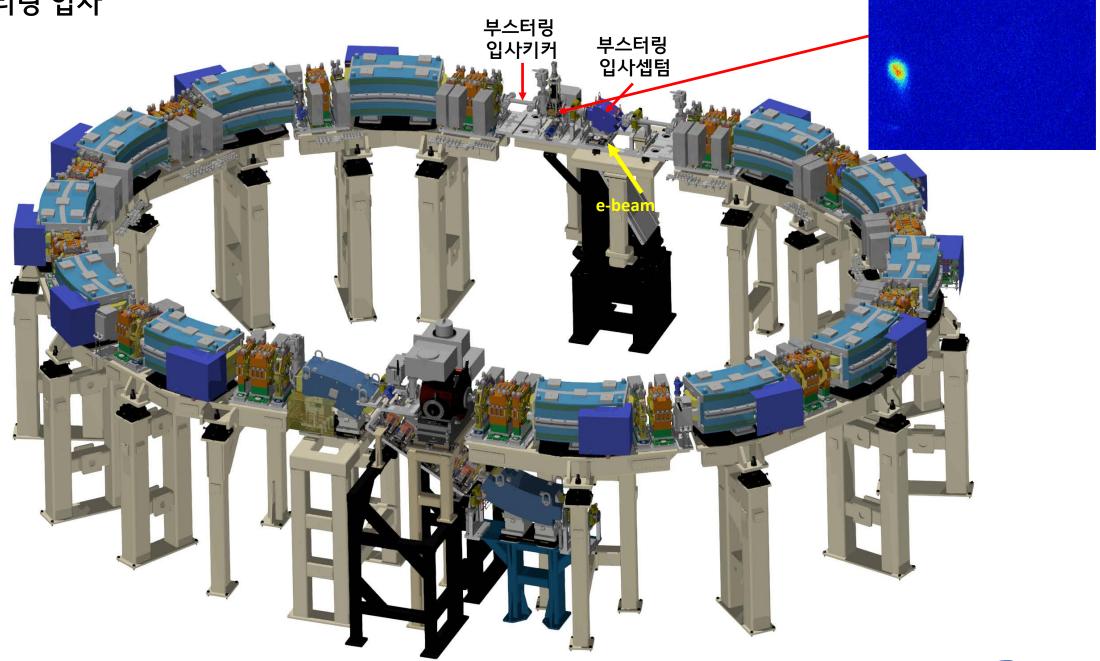


SCM3 (부스터링 입사 SM 뒤)


### 부스터링 DC 운전

- ❖ 23. 2~3월 주요 장치 EPICS IOC/CSS GUI 프로그램 적용하며 빔저장이 쉬운 Lattice 적용하여 DC 운전 시작
- ❖ 전자석 램핑 (ramping) 없이 DC (20 MeV) 에서 전자빔을 부스터링에서 회전 → DC 상태에서 ~800 ms 진행
- ❖ <u>반도체 모듈레이터 아킹, 전자총 레이저 고장/수리 등 다운타임 다수 발생</u>

### 부스터링 RF OFF 상태에서 전자 빔 1~2 ms 진행

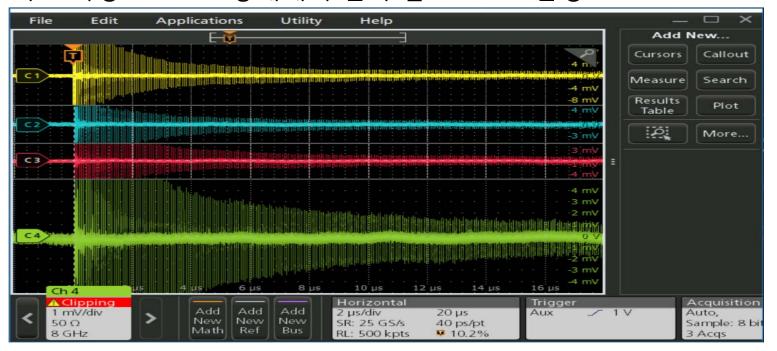



### 부스터링 RF ON 상태에서 전자 빔 ~1s 진행

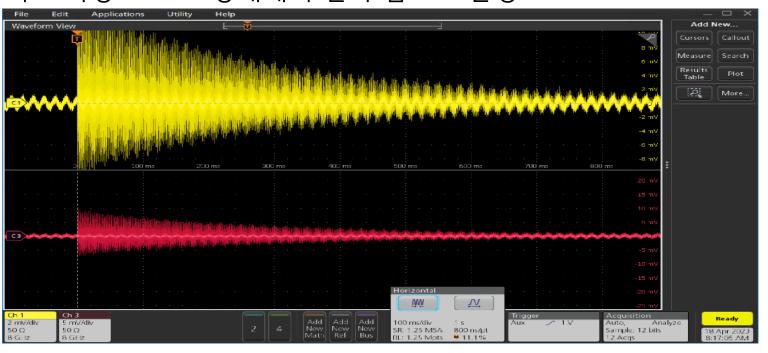

### 부스터링 전자석 램핑 (Ramping)


- ❖ 23. 4월 부스터링 전자석 램핑 시도
- MPS waveform EPICS화, 내부 오실로스코프 신호 확인 Python 프로그램 적용, MPS 램핑 적용 Matlab 프로그램 적용
- BPM electronics 60 Hz waveform 적용
- ❖ 23. 5월 전자빔 출사를 위해 Tune을 조정한 레티스 변경 후 전자석 램핑 계속 → 23. 7월 초 320 MeV 확인 (그림 a)
- BPM electronics 모드 변경으로 1024 point waveform 확인 가능
- ❖ 23. 7월 램핑 시간을 줄여 램핑 → 400 MeV (~1 pC) 확인 (그림 b)

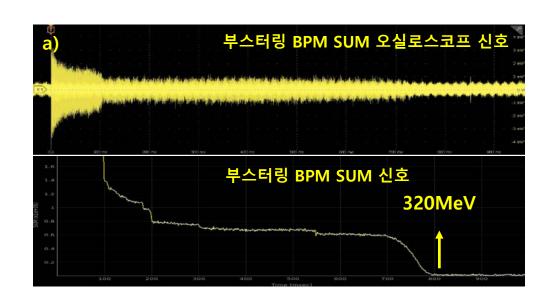


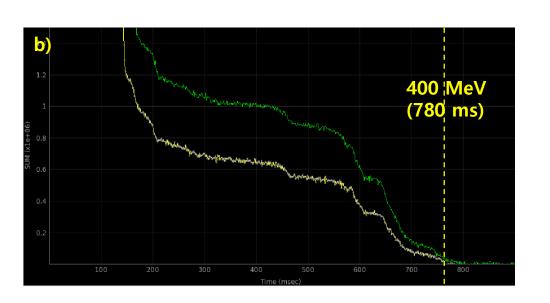



### 예) 부스터링 전자석 Ramping Waveform

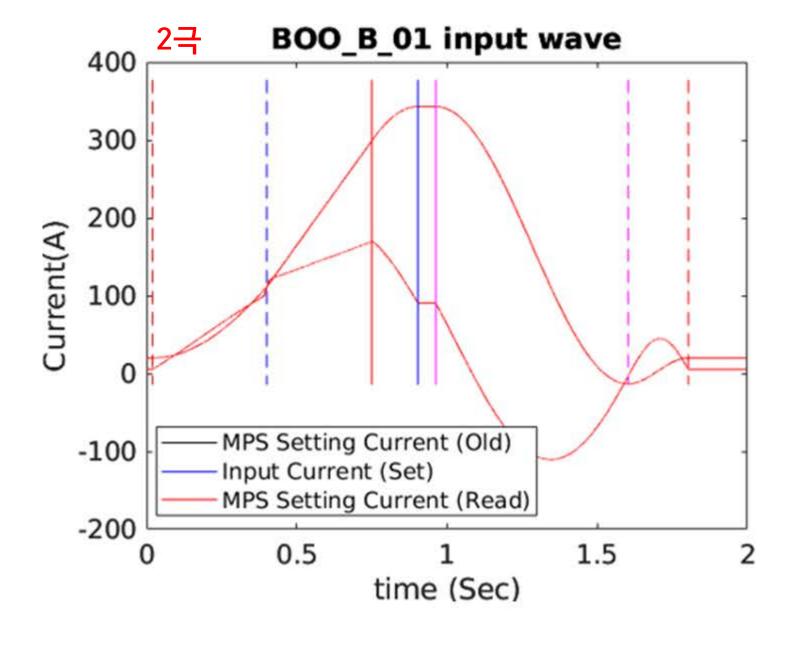


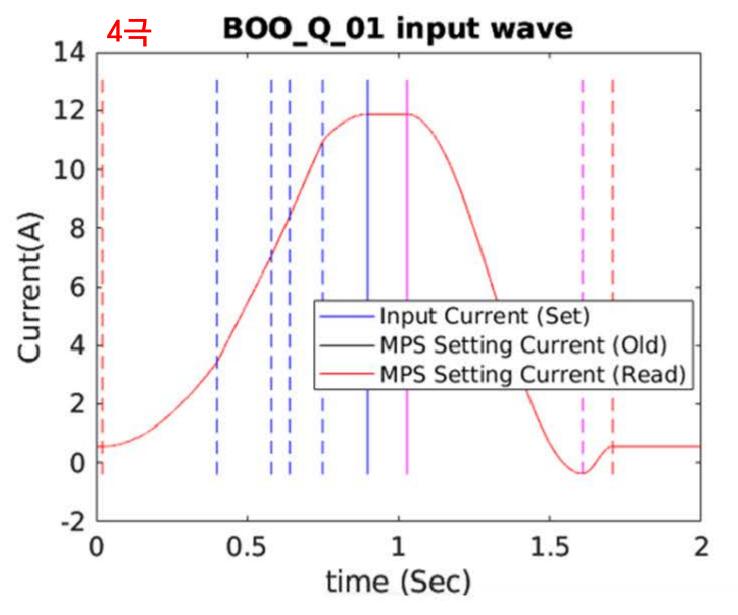





# 부스터링 출사

- ❖ 23. 8월 부스터링 출사셉텀 ON 후 DC 운전 (그림 a)
- ❖ 23. 9월 부스터링 출사셉텀 ON 후 전자석 램핑 진행중 →110 ms (9.25, 목표 780 ms) (그림 b)

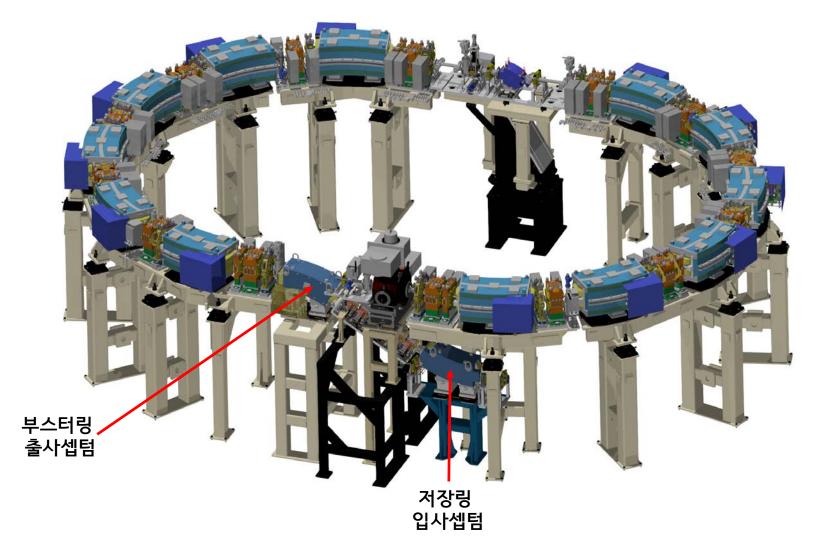

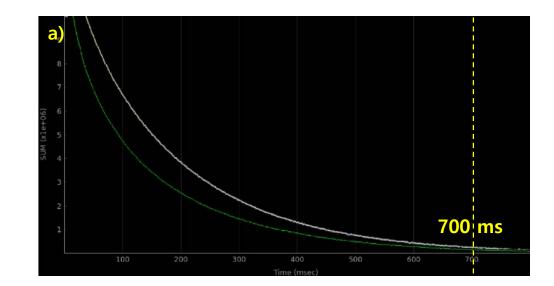


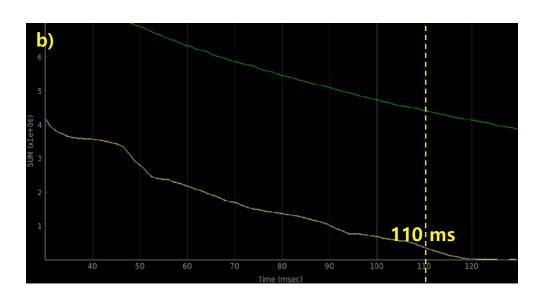




### 해야 할 일 - 부스터링 출사

- ❖ 부스터링 출사 부스터링 출사키커 (스트립라인형) →부스터링 입사키커 사용 경험을 있음
- ❖ 고려점
- 부스터링 출사 어려울 경우 새로운 레티스를 적용하고 다시 램핑을 해야할 수도 있음

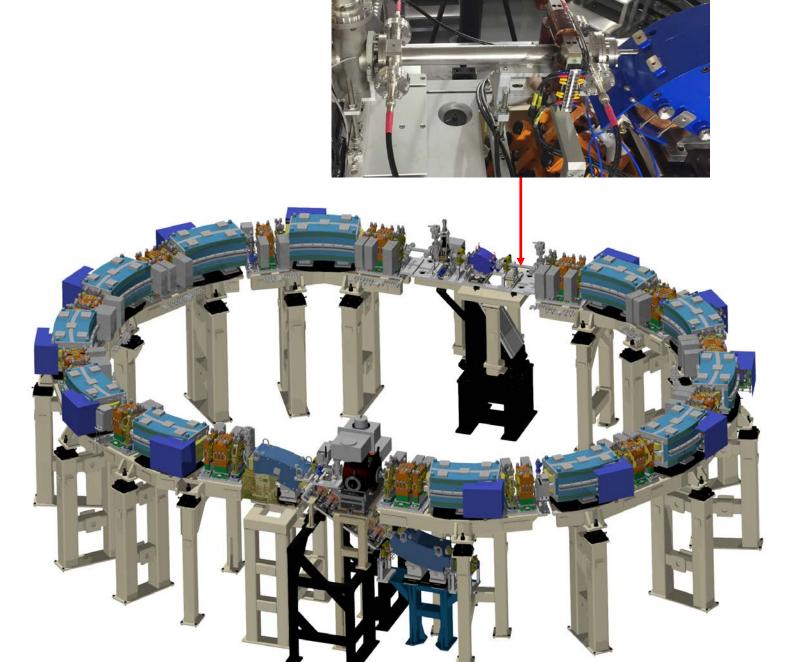




# 해야 할 일 - 저장링 입사/저장/EUV 발생

❖ 저장링 입사 - 저장링 입사키커

❖ 저장링 저장 EUV 발생 - 언듈레이터 (고정갭)





Hybrid, out-vacuum undulator

Period length: 14.6 mm

Total magnetic length: 2.7 m, 183(+2) periods

Magnetic gap: 8.8 mm

K-value : 0.502 Peak field : 0.368 T Phase error < 10°

Magnetic material : NdFeB 47HN
Pole material : Vanadium Permendur



### 시운전 예상 일정

구분	23					24										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
일정	시운전 (데모실험 포함) 및 장비 안정화												이용자 지원			

23. 11 : 부스터링 전자빔 출사, 저장링 전자빔 입사

23. 12 : 저장링 1번치 전자빔 저장

24. 1 : 저장링 전자빔 저장

24. 2 : 광자빔(EUV) 발생

24. 3~4 : 빔전류 증강

24. 5 : 유지보수

24. 6 : 최종 점검

24. 7~8: 데모실험

24. 9~: 이용자 지원

#### \* 당초 계획 (23년 9월 이용자 지원) 대비 일정 지연으로 운영계획 조정

- 극자외선 가속기 시운전 일정을 현실화하고, 시운전 과정에 다목적 가속기 지원 인력도 함께 참여하여 노하우 공유 추진
- 다목적 가속기의 선행연구장비 / 테스트베드의 역할도 겸하고 있어, 충분한 시운전 기간 확보를 통해 관련 기술 확보 추진

경청해 주셔서 감사합니다.

